

Kystsikring



Teknik og Miljø
Natur, Vej og Trafik
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Status og prioritering af kystbeskyttelsessager

I forbindelse med vedtagelsen af klimaplanen i 2011 blev det besluttet, at Slagelse Kommune skulle være procesmyndighed for kystbeskyttelsesprojekter i Korsør, Skælskør og Halsskov.

I 2012 blev det besluttet, at starte med højvandsikring af Korsør, fordi Korsør er udpeget som et risikoområde for oversvømmelser i henhold til oversvømmelsesdirektivet.


I forbindelse med vedtagelsen af handleplanen til klimatilpasningsplanen i august 2014 blev det præciseret, at processen med at få højvandsikret Skælskør skal rejses i forlængelse af kystbeskyttelsessagerne i Korsør og Halsskov.

Højvandsikringen i Korsør/Halsskov er inddelt i 6 områder:

Juli 2017
Sagsnr.: 330-2012-18507

Kontaktperson:
Kristina Bjerre /Karen Vestergaard/Flemming Kortsen

Fax.
EAN: 5798007388331

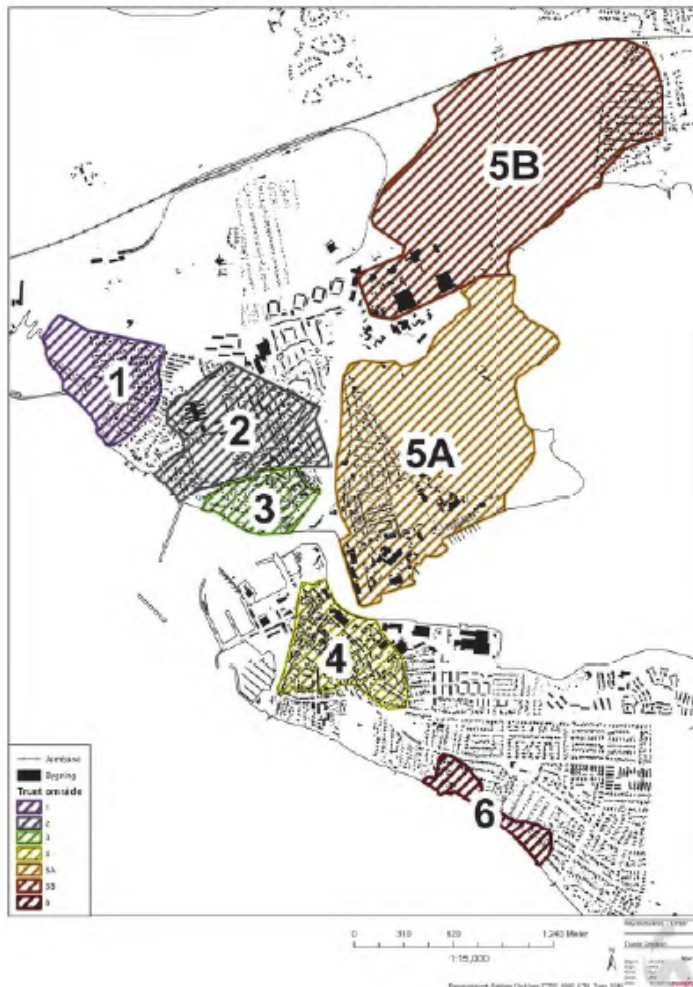

Indtil videre er processen startet op i område 1, 2 og 3 (Halsskov) og område 4 (Korsør by). Det er uklart om område 5a, 5b og 6 skal højvandsikres før end processen startes op i Skælskør.

Halsskov

Digesagerne på Halsskov omfatter i alt tre områder, der alle blev startet op af kommunen i 2013. Alle sager er blevet fremmet første gang og er på nuværende tidspunkt i gang med afklaring af skitseprojekt og partsfordelinger. Ingen af de tre sager ligger pt. i Natur- og Miljøklagenævnet. NIRAS er rådgiver på sagerne.

Område 1

Rådgiver er ved at udarbejde et revideret skitseforslag, som drejer sig om ændring af diget ved Granskoven. Vi forventer at modtage forslaget i januar 2017. Forslaget skal herefter godkendes i hele digegruppe 1 og der skal af-

holdes møde for at afklare om Granskoven og digegruppe 1 skal fortsætte i fællesskab.

Side3/7

Afhængig af evt. bemærkninger skal projektet revideres og når der forligger et færdigt skitseprojekt med partsfordeling sendes det til udtalelse i Kystdirektoratet. Afhængig af evt. bemærkninger fra Kystdirektoratet skal projektet tilrettes.

Projektforslaget skal herefter godkendes af EPM hvorefter det kan sendes i offentlig høring og vi kan afholde et offentligt møde. Efter høringsperioden samler vi høringssvarene og tilretter projekterne i forhold til høringssvarene. Derefter skal EPM endeligt godkende projekterne. Afgørelsen offentliggøres og kan påklages. Hvis afgørelsen ikke påklages, kan kystdirektoratet ansøges om tilladelse til udførelse af det konkrete projekt.

Færgehavnen ligger inden for område 1 og skal først højvandssikres i forbindelse med et evt. boligbyggeri.

Afhængig af klager forventes højvandssikringen af område 1 at være afsluttet i 2018 - 2019?

Område 2

Rådgiveren har udarbejdet et projektforslag, som i november 2016 blev sendt til udtalelse i Kystdirektoratet. Afhængig af evt. bemærkninger fra Kystdirektoratet skal projektet tilrettes.

Projektforslaget skal herefter godkendes af EPM hvorefter det kan sendes i offentlig høring og vi kan afholde et offentligt møde. Efter høringsperioden samler vi høringssvarene og tilretter projekterne i forhold til høringssvarene. Derefter skal EPM endeligt godkende projekterne. Afgørelsen offentliggøres og kan påklages. Hvis afgørelsen ikke påklages, kan Kystdirektoratet ansøges om tilladelse til udførelse af det konkrete projekt.

Afhængig af klager forventes højvandssikringen af område 2 at være afsluttet i 2018 - 2019?

Område 3

Der er i januar 2016 afholdt kap 1a møde og der er udarbejdet et færdigt projektforslag med partsfordeling, som egentlig er klar til at blive godkendt politisk. På grund af uklarhed om fortolkning af partfordeling i forhold til forsyningssskaber er sagen sat lidt i beror.

Når der er klarhed over partsfordeling med forsyningssselskaber skal Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget endelig godkende projektforslaget og partsfordelingen. Afgørelsen offentliggøres og kan påklages.

Hvis afgørelsen ikke påklages, kan Kystdirektoratet ansøges om tilladelse til udførelse af det konkrete projekt.

Afhængig af klager forventes højvandssikringen af område 3 at være afsluttet i 2018?

Korsør by (område 4)

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget besluttede den 9. januar 2017 at igangsættes en visionsproces for højvandssikringen af Korsør by. I løbet af foråret 2017 er der blevet afholdt to workshops med en inspirationsgruppe bestående af repræsentanter fra Korsør Havn, lystbådehavn, Havnearkaderne, Korsør Lokalråd, Korsør bymidtegruppe, bevaringsforeningen, fiskerihavnen og Korsør Cityforening. På baggrund af de to workshops er der blevet udarbejdet et visionsprospekt. Visionsprospektet skal danne baggrund for den videre politiske stillingtagen, herunder fastlæggelse af en økonomisk ramme for projektet. Visionsprospektet forventes at kunne forelægges udvalget til august.

Hvis udvalget vælger at fremme projektet, skal ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller andre fordele, underrettes om afgørelsen. Derefter skal der udarbejdes et egentligt projektforslag, der skal sendes i offentlig høring og i høring hos alle, der kan blive pålagt bidragspligt og interessenter.

Efter høringsperioden vil projektet eventuelt blive tilrettet på baggrund af høringssvarene. Udvalget skal herefter godkende projektet. Når projektet er godkendt offentliggøres afgørelsen. Der vil være mulighed for at påklage afgørelsen. Hvis afgørelsen ikke påklages, kan Kystdirektoratet ansøges om tilladelse til udførelse af det konkrete projekt.

Når alle tilladelser er opnået følger en projekterings- og anlægsfase.

Højvandssikringen af Korsør kan forventes at være afsluttet i 2020?

Side5/7

Område 5A, 5b og 6

Der er endnu ikke igangsat en proces for højvandssikring af disse områder.

Næsby Strand

Slagelse Kommune har bistået i sagen siden starten af 2014. Sagen blev politisk fremmet første gang i juni 2014, uden klager. Herefter blev der udarbejdet et skitseprojekt og afholdt kap 1a møde med grundejerne.

Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget fremmede 1. december 2015 sagen om et dige ved Næsby Strand. Udvalget godkendte partsfordelingen med forbehold for SK Forsynings bidrag.

Afgørelsen blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening og grundejere til to ejendomme.

Center for Teknik og Miljø afventer Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse i sagen, som forventes afgjort i første kvartal i år.

Afhængig af klagernes udfald kan højvandssikringen af Næsby Strand forventes at være afsluttet i 2018 - 2019?

Skælskør by

Indtil videre er den politiske aftale, at processen omkring højvandssikring af Skælskør by rejses i forlængelse af sagerne i Halskov og Korsør, jf. Handleplan til klimatilpasningsplanen fra august 2014.

Kobæk Sønderstrand

Grundejerne ved Kobæk Sønderstrand har selv rejst en kystbeskyttelsessag. Grundejerne har indsendt en ansøgning til Kystdirektoratet og afventer en afgørelse derfra.

Tjokholmdæmningen

I forbindelse med Tude Å-projektet skal der nedlægges to offentlige pumpelag og oprettes et nyt offentligt og et nyt privat pumpelag. Kystbeskyttelsesplanlægget Tjokholmdæmningen er administreret som et digeanlæg efter vandløbsloven af det offentlige pumpelag Tjæreby Ydre Vejle, som er et af de to offentlige pumpelag, som nedlægges ved oprettelsen af vådområdet. I den forbindelse er der opstået et ønske fra lodsejere i begge pumpelag om, at Tjokholmdæmningen, fremover skal være et anlæg i et offentlig kystsikringslag. Dette indebærer bl.a. en ændret partsfordeling. Sagen kommer til at køre som en forsimplet kap 1a-sag efter kystbeskyttelsesloven. Partsfordelingen afventer Kystdirektoratets vejledning om bidragsmodeller, der forventes at blive offentliggjort i december 2017

.

Stignæs Skov

Borreby Gods har haft opfattelsen af at etableringen af Stignæs Havn har medført en omfattende erosion af kysten omkring Stignæs Skov. De har tidligere rejst et ønske om at få reetableret kysten og få etableret kystsikring ud for skoven. Det er ikke sket noget i sagen i lang tid

Bisserup

Grundejere ved Bisserup har tidligere ønsket at Slagelse og Næstved kommuner rejser en sag om højvandssikring af Bisserup. Kommunen har indtil nu ikke foretages sig noget i sagen.

Svenstrup-Knivkær

Grundejerforeningerne er i dialog med Kystdirektoratet om et kystbeskyttelsesprojekt. Kommunen er ikke involveret, men vi svarer jævnligt på henvendelser.

Lossepladsen ved Korsør Nor

Det var på et tidspunkt nogle "skriverier" og Korsør Nor. Der er ikke akut risiko, men lossepladsen bør fremtidssikres i forhold til udvaskning ved havstigning og risiko for højvande.

Ressourcer

Vi i flere år brugt ca. lidt over et årsværk på kystbeskyttelsessager. I dag er det fordelt på to medarbejdere, som er delvist finansieret over klimakontoen

Karen Vestergaard er projektleder på Halsskov-sagerne (område 1, 2 og 3), samt Næsby Strand. Kristina Bjerre er projektleder for højvandsikringen af Korsør by (område 4). Ud over disse større opgaver, håndteres sager som løbende dukker op – fx ændring af partsfordeling af Tjokholmdæmningen mv
