Renovering af skolernes toiletfaciliteter

Udskrevet den 11. december 2019 16:44

POWERED BY GenieBelt
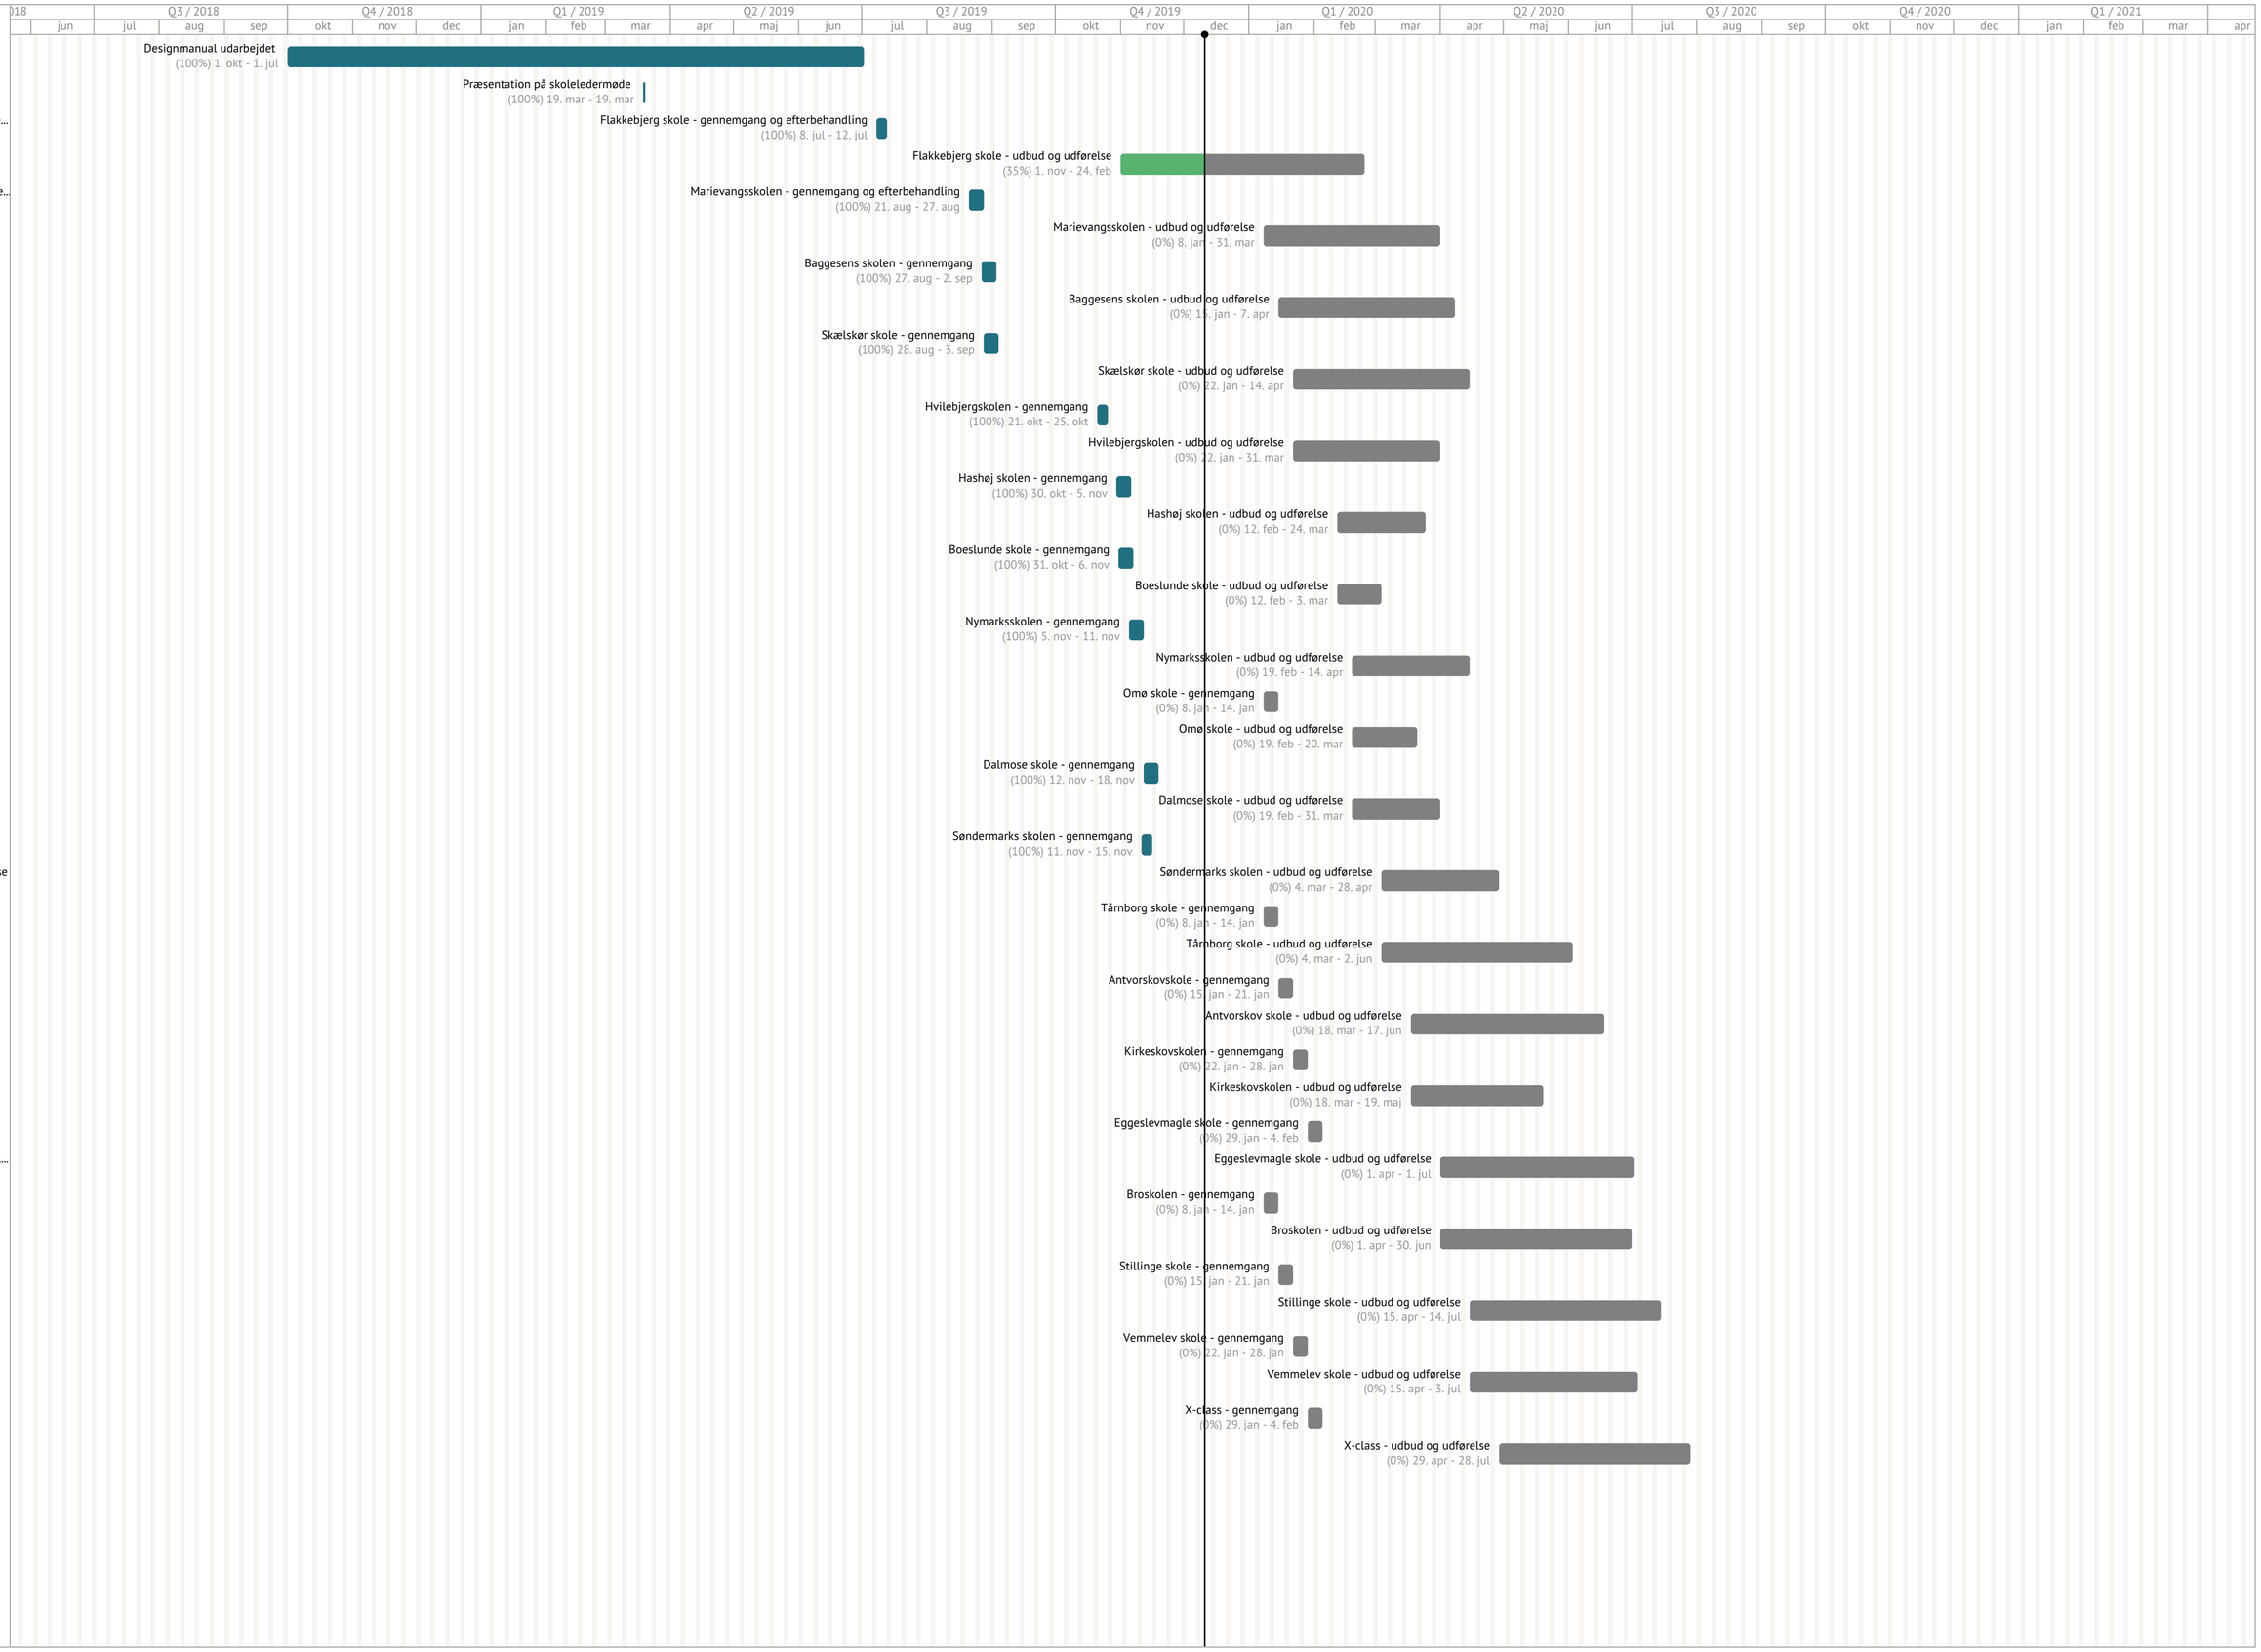
Navn	
Designmanual udarbejdet	(100%) 1. okt - 1. jul (195 days)
Præsentation på skoleledermøde	(100%) 19. mar - 19. mar (0 days)
Flakkebjerg skole - gennemgang og efte...	(100%) 8. jul - 12. jul (4 days)
Flakkebjerg skole - udbud og udførelse	(35%) 1. nov - 24. feb (81 days)
Marievangsskolen - gennemgang og efte...	(100%) 21. aug - 27. aug (4 days)
Marievangsskolen - udbud og udførelse	(0%) 8. jan - 31. mar (59 days)
Baggesens skolen - gennemgang	(100%) 27. aug - 2. sep (4 days)
Baggesens skolen - udbud og udførelse	(0%) 15. jan - 7. apr (59 days)
Skælskør skole - gennemgang	(100%) 28. aug - 3. sep (4 days)
Skælskør skole - udbud og udførelse	(0%) 22. jan - 14. apr (59 days)
Hvilebjergskolen - gennemgang	(100%) 21. okt - 25. okt (4 days)
Hvilebjergskolen - udbud og udførelse	(0%) 22. jan - 31. mar (49 days)
Hashøj skolen - gennemgang	(100%) 30. okt - 5. nov (4 days)
Hashøj skolen - udbud og udførelse	(0%) 12. feb - 24. mar (29 days)
Boeslunde skole - gennemgang	(100%) 31. okt - 6. nov (4 days)
Boeslunde skole - udbud og udførelse	(0%) 12. feb - 3. mar (14 days)
Nymarksskolen - gennemgang	(100%) 5. nov - 11. nov (4 days)
Nymarksskolen - udbud og udførelse	(0%) 19. feb - 14. apr (39 days)
Omø skole - gennemgang	(0%) 8. jan - 14. jan (4 days)
Omø skole - udbud og udførelse	(0%) 19. feb - 20. mar (22 days)
Dalmose skole - gennemgang	(100%) 12. nov - 18. nov (4 days)
Dalmose skole - udbud og udførelse	(0%) 19. feb - 31. mar (29 days)
Søndermarks skolen - gennemgang	(100%) 11. nov - 15. nov (4 days)
Søndermarks skolen - udbud og udførelse	(0%) 4. mar - 28. apr (39 days)
Tårnborg skole - gennemgang	(0%) 8. jan - 14. jan (4 days)
Tårnborg skole - udbud og udførelse	(0%) 4. mar - 2. jun (64 days)
Antvorskovskole - gennemgang	(0%) 15. jan - 21. jan (4 days)
Antvorskov skole - udbud og udførelse	(0%) 18. mar - 17. jun (65 days)
Kirkeskovskolen - gennemgang	(0%) 22. jan - 28. jan (4 days)
Kirkeskovskolen - udbud og udførelse	(0%) 18. mar - 19. maj (44 days)
Eggeslevmagle skole - gennemgang	(0%) 29. jan - 4. feb (4 days)
Eggeslevmagle skole - udbud og udførel...	(0%) 1. apr - 1. jul (65 days)
Broskolen - gennemgang	(0%) 8. jan - 14. jan (4 days)
Broskolen - udbud og udførelse	(0%) 1. apr - 30. jun (64 days)
Stillinge skole - gennemgang	(0%) 15. jan - 21. jan (4 days)
Stillinge skole - udbud og udførelse	(0%) 15. apr - 14. jul (64 days)
Vemmelev skole - gennemgang	(0%) 22. jan - 28. jan (4 days)
Vemmelev skole - udbud og udførelse	(0%) 15. apr - 3. jul (57 days)
X-class - gennemgang	(0%) 29. jan - 4. feb (4 days)
X-class - udbud og udførelse	(0%) 29. apr - 28. jul (64 days)
