Ny daginstitution ved Jonslunden

Udskrevet den 1. juli 2019 15:16

POWERED BY GenieBelt
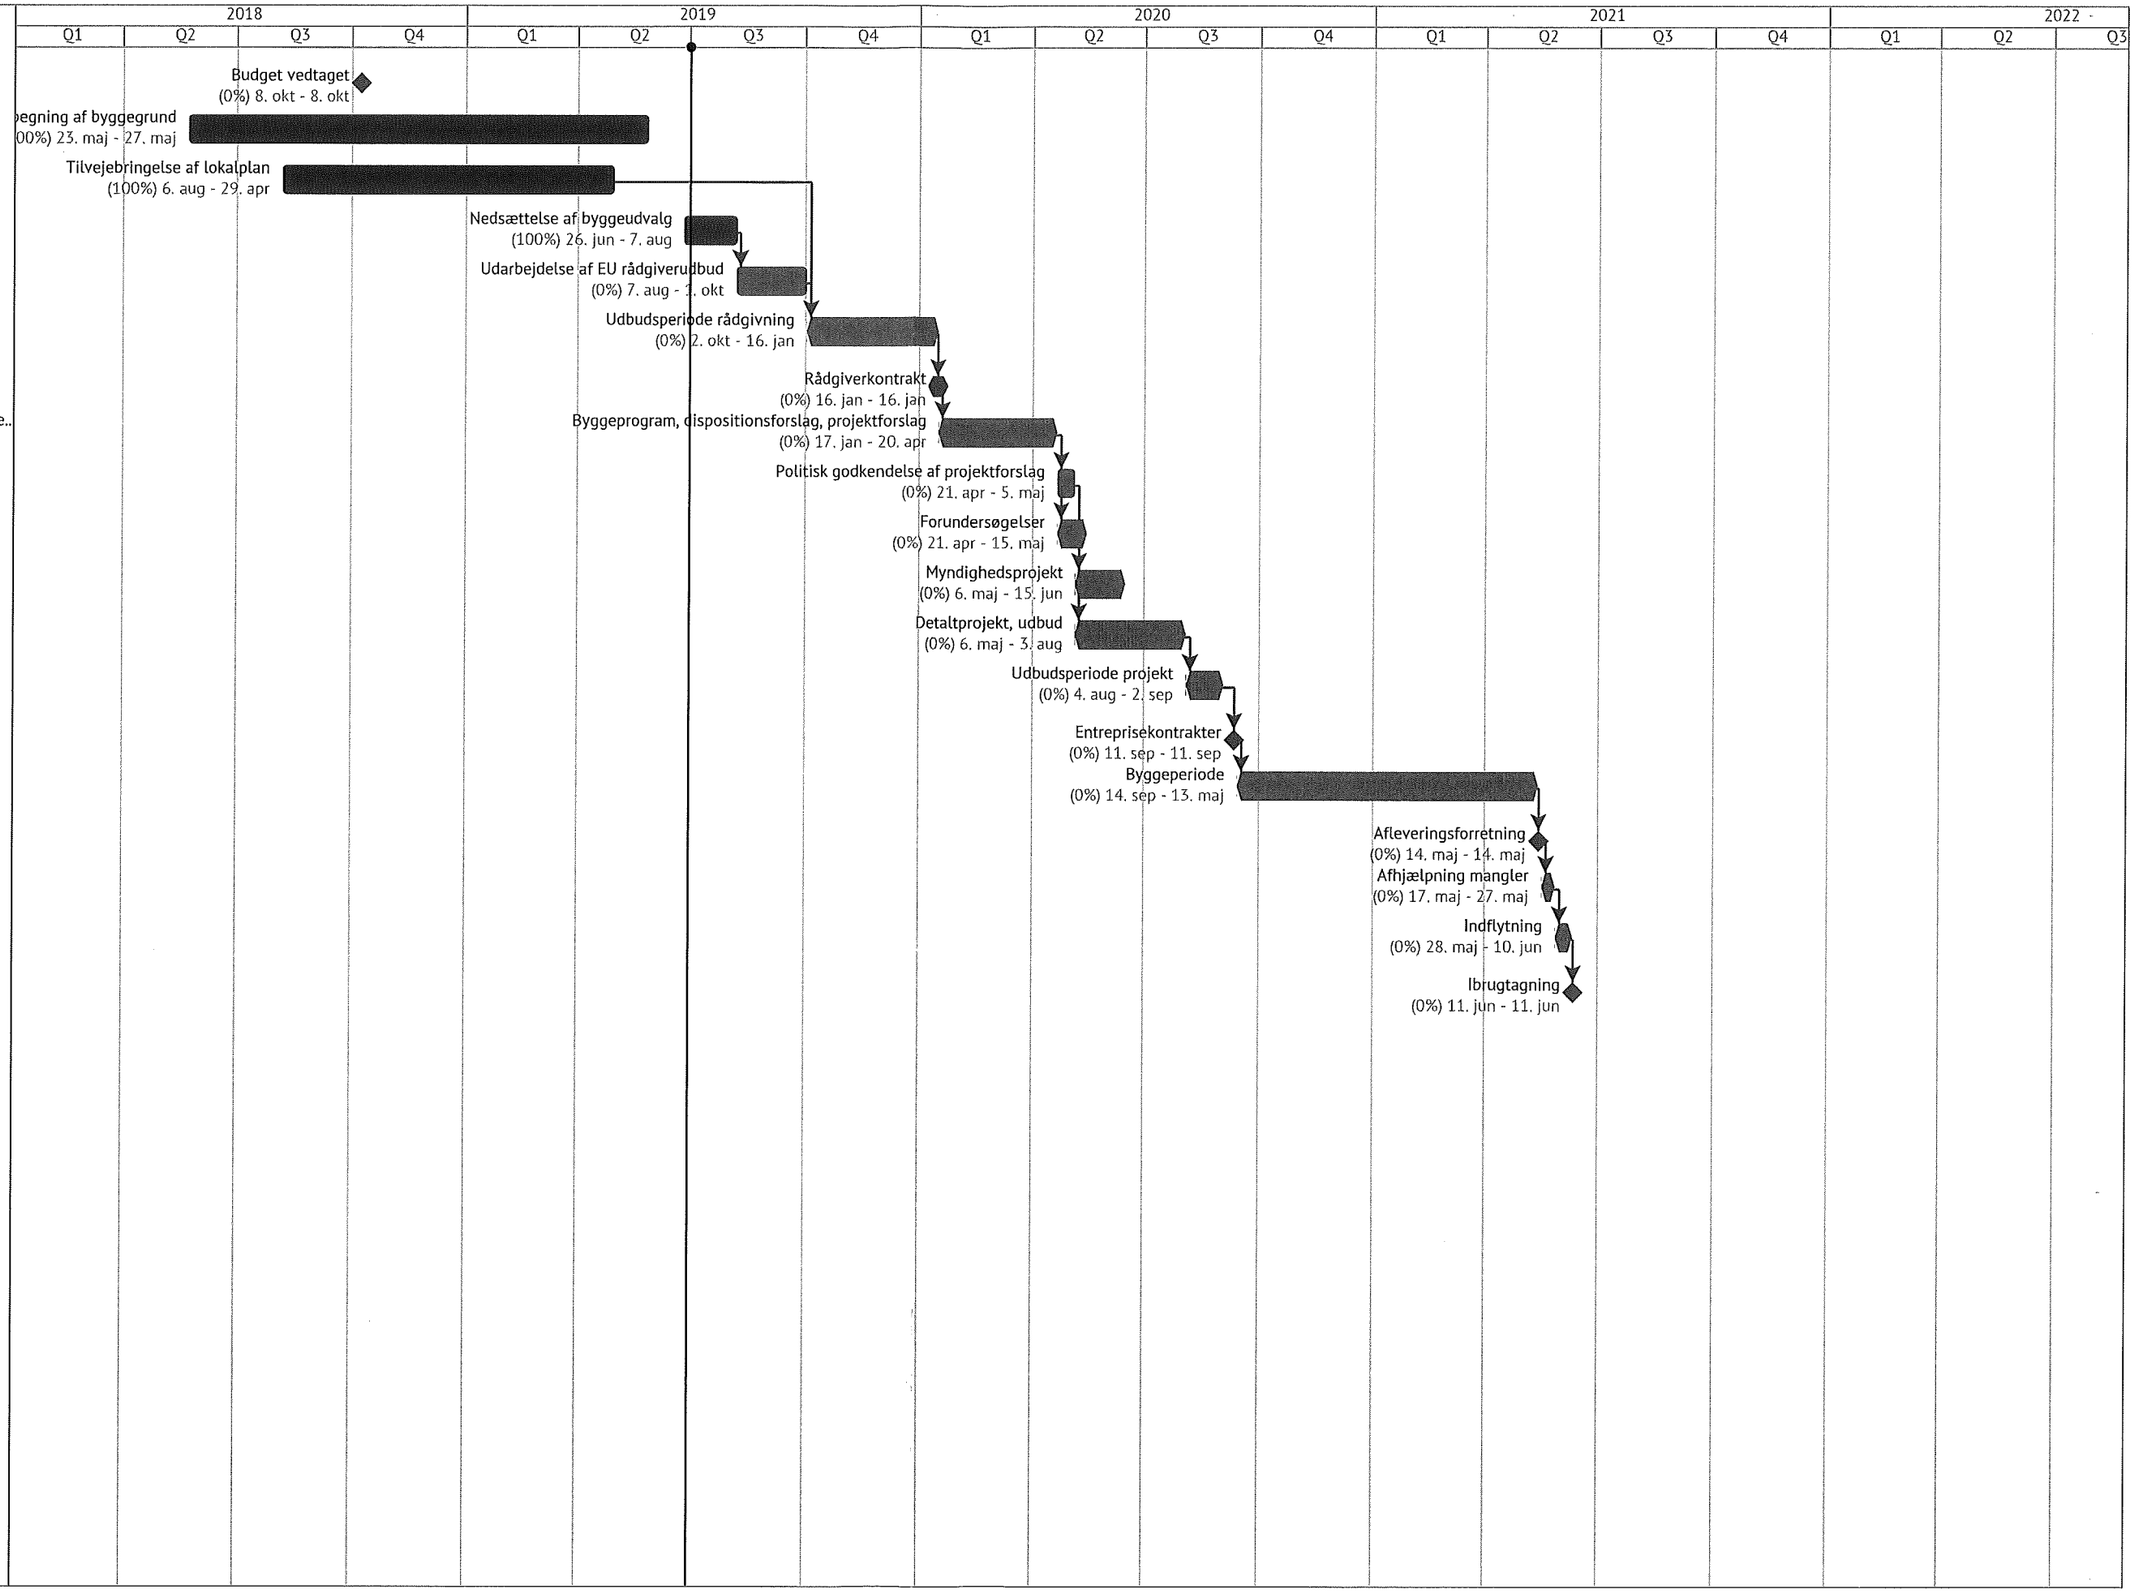
Navn	
Budget vedtaget	(0%) 8. okt - 8. okt (0 days)
Udpegning af byggegrund	(100%) 23. maj - 27. maj (263 days)
Tilvejebringelse af lokalplan	(100%) 6. aug - 29. apr (190 days)
Nedsættelse af byggeudvalg	(100%) 26. jun - 7. aug (30 days)
Udarbejdelse af EU rådgiverudbud	(0%) 7. aug - 1. okt (39 days)
Udbudsperiode rådgivning	(0%) 2. okt - 16. jan (76 days)
Rådgiverkontrakt	(0%) 16. jan - 16. jan (0 days)
Byggeprogram, dispositionsforslag, proje..	(0%) 17. jan - 20. apr (66 days)
Politisk godkendelse af projektforslag	(0%) 21. apr - 5. maj (10 days)
Forundersøgelser	(0%) 21. apr - 15. maj (18 days)
Myndighedsprojekt	(0%) 6. maj - 15. jun (28 days)
Detaltprojekt, udbud	(0%) 6. maj - 3. aug (63 days)
Udbudsperiode projekt	(0%) 4. aug - 2. sep (21 days)
Entreprisekontrakter	(0%) 11. sep - 11. sep (0 days)
Byggeperiode	(0%) 14. sep - 13. maj (173 days)
Afleveringsforretning	(0%) 14. maj - 14. maj (0 days)
Afhjælpning mangler	(0%) 17. maj - 27. maj (8 days)
Indflytning	(0%) 28. maj - 10. jun (9 days)
Ibrugtagning	(0%) 11. jun - 11. jun (0 days)
