Skanderborgvej 9 - Nybygning daginstitution

Udskrevet den 17. august 2018 12:15

POWERED BY GenieBelt
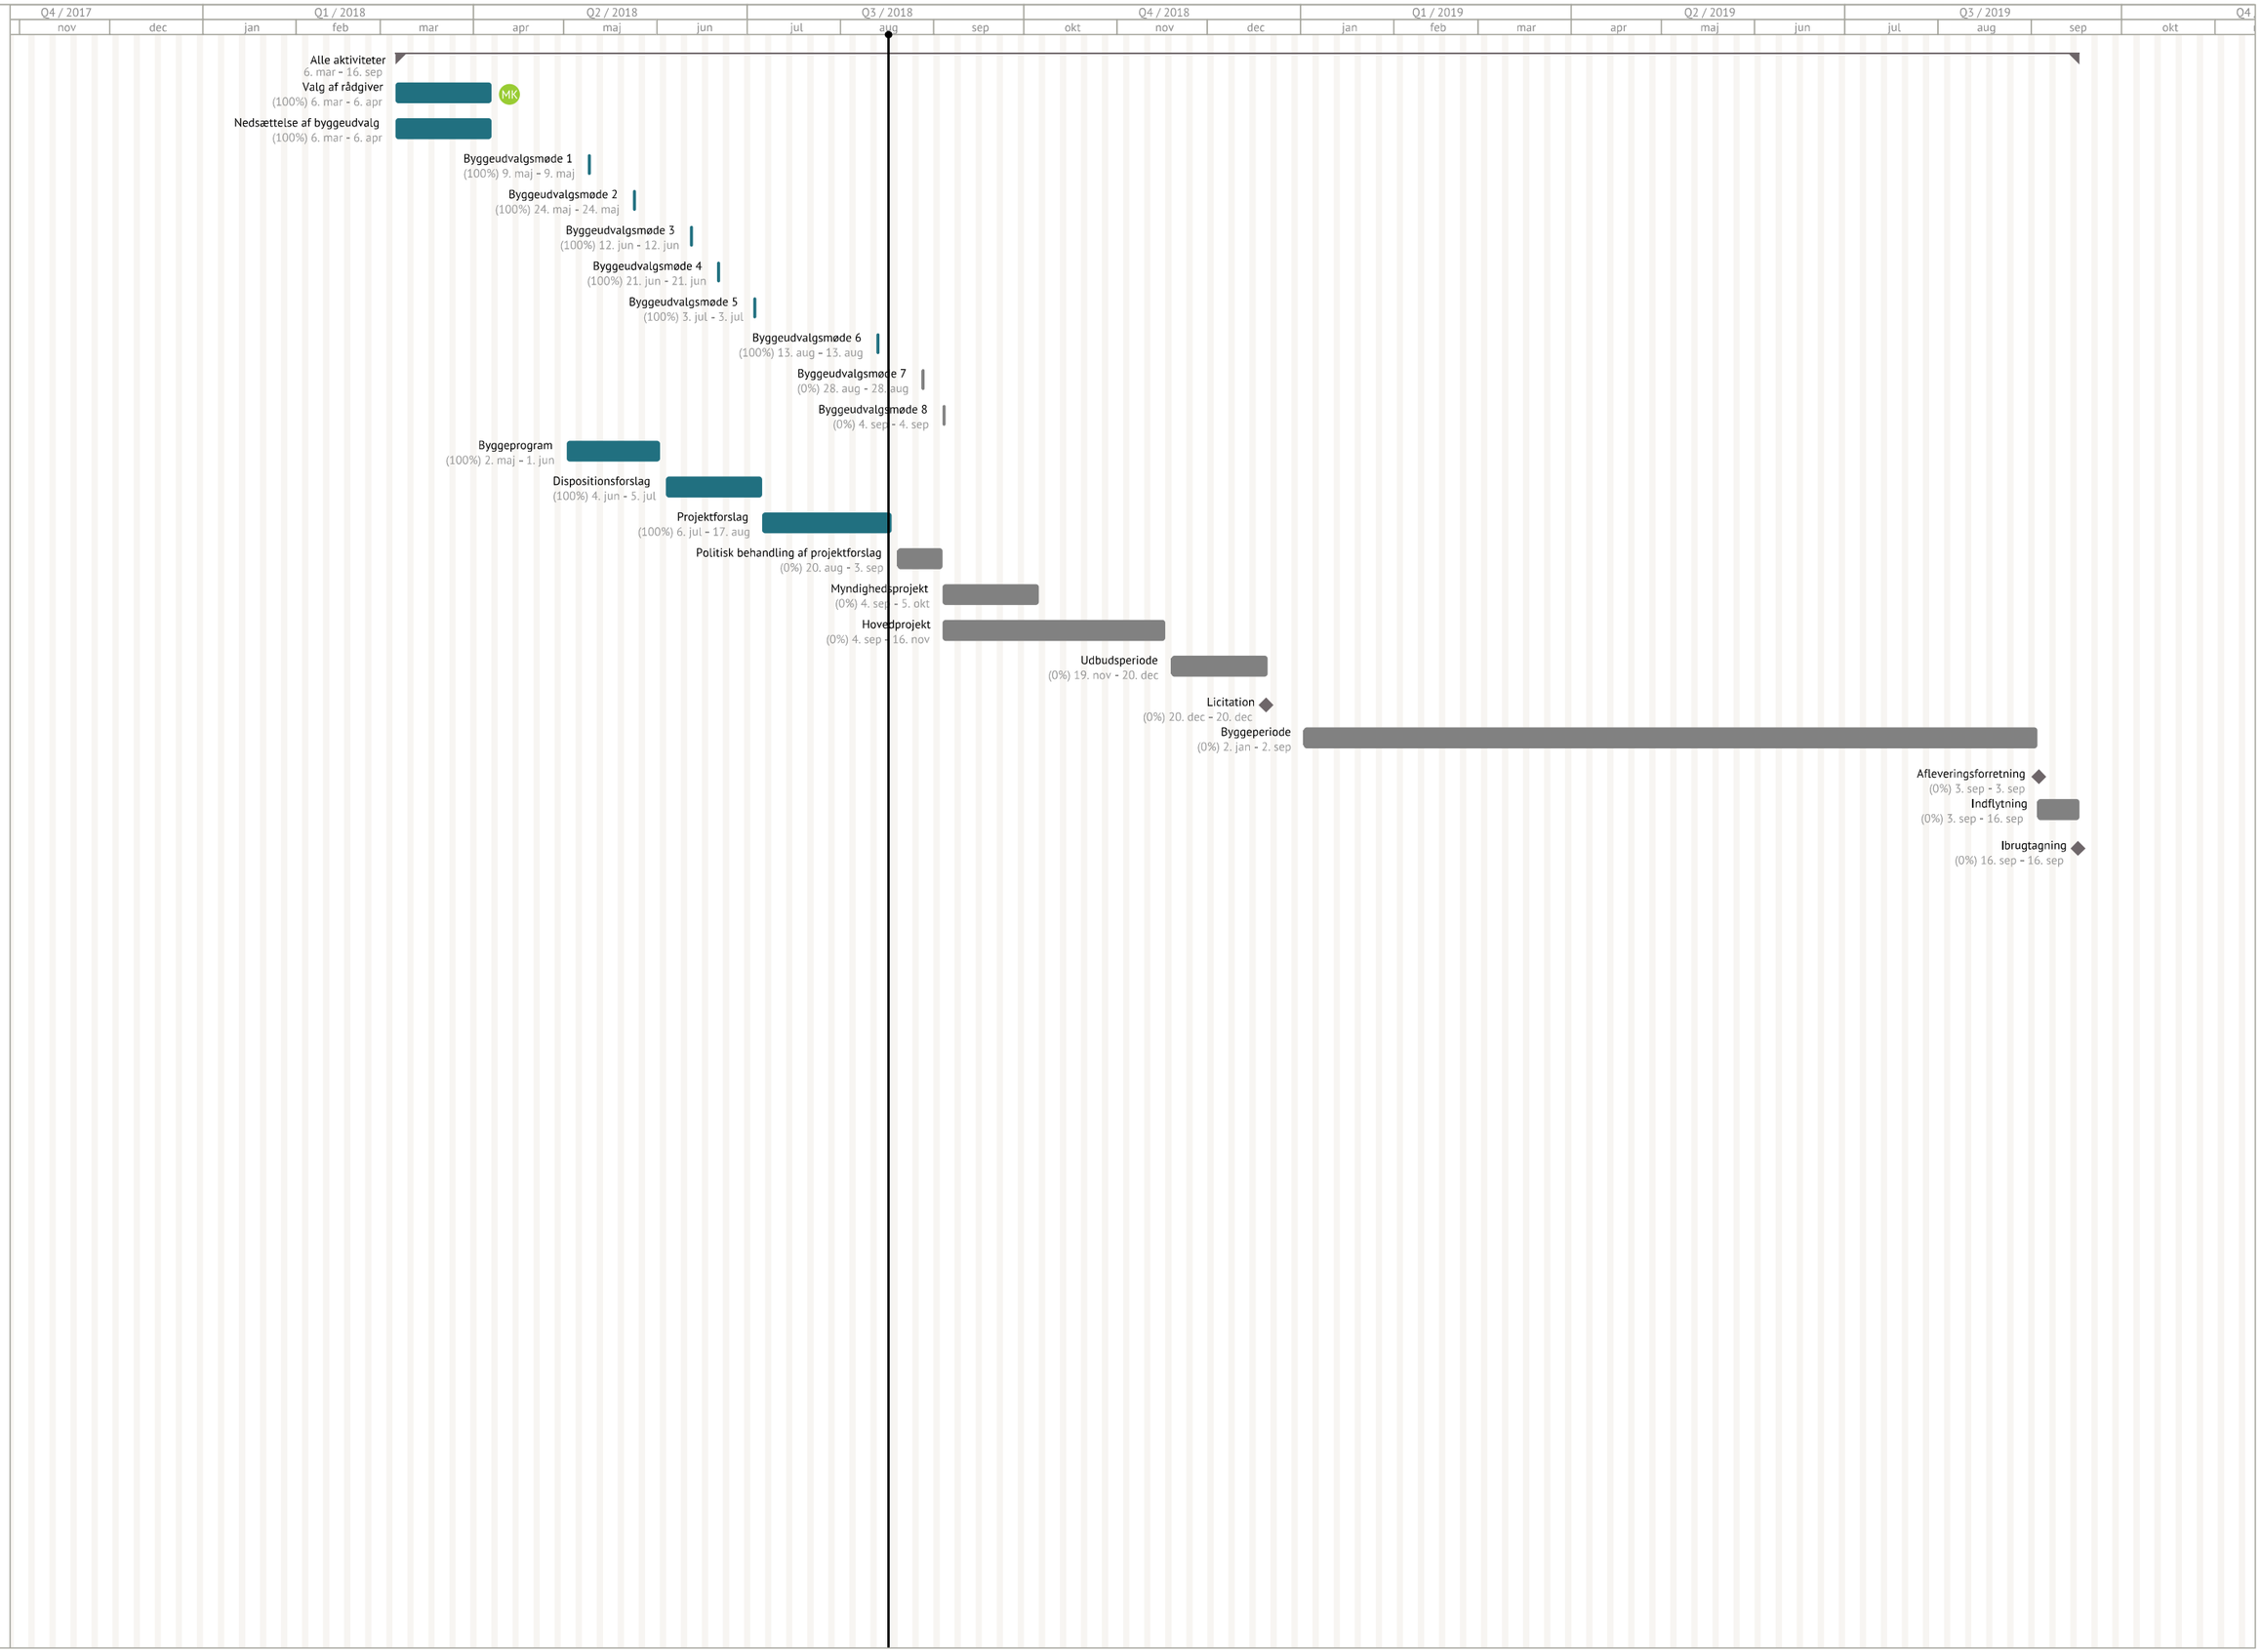
Navn	
Alle aktiviteter	6. mar - 16. sep
Valg af rådgiver	(100%) 6. mar - 6. apr (24 days)
Nedsættelse af byggeudvalg	(100%) 6. mar - 6. apr (24 days)
Byggeudvalgsmøde 1	(100%) 9. maj - 9. maj (1 days)
Byggeudvalgsmøde 2	(100%) 24. maj - 24. maj (1 days)
Byggeudvalgsmøde 3	(100%) 12. jun - 12. jun (1 days)
Byggeudvalgsmøde 4	(100%) 21. jun - 21. jun (1 days)
Byggeudvalgsmøde 5	(100%) 3. jul - 3. jul (1 days)
Byggeudvalgsmøde 6	(100%) 13. aug - 13. aug (1 days)
Byggeudvalgsmøde 7	(0%) 28. aug - 28. aug (1 days)
Byggeudvalgsmøde 8	(0%) 4. sep - 4. sep (1 days)
Byggeprogram	(100%) 2. maj - 1. jun (23 days)
Dispositionsforslag	(100%) 4. jun - 5. jul (24 days)
Projektforslag	(100%) 6. jul - 17. aug (31 days)
Politisk behandling af projektforslag	(0%) 20. aug - 3. sep (11 days)
Myndighedsprojekt	(0%) 4. sep - 5. okt (24 days)
Hovedprojekt	(0%) 4. sep - 16. nov (54 days)
Udbudsperiode	(0%) 19. nov - 20. dec (24 days)
Licitation	(0%) 20. dec - 20. dec (1 days)
Byggeperiode	(0%) 2. jan - 2. sep (174 days)
Afleveringsforretning	(0%) 3. sep - 3. sep (1 days)
Indflytning	(0%) 3. sep - 16. sep (10 days)
Ibrugtagning	(0%) 16. sep - 16. sep (1 days)
