


Procesplan Skæve boliger Toften

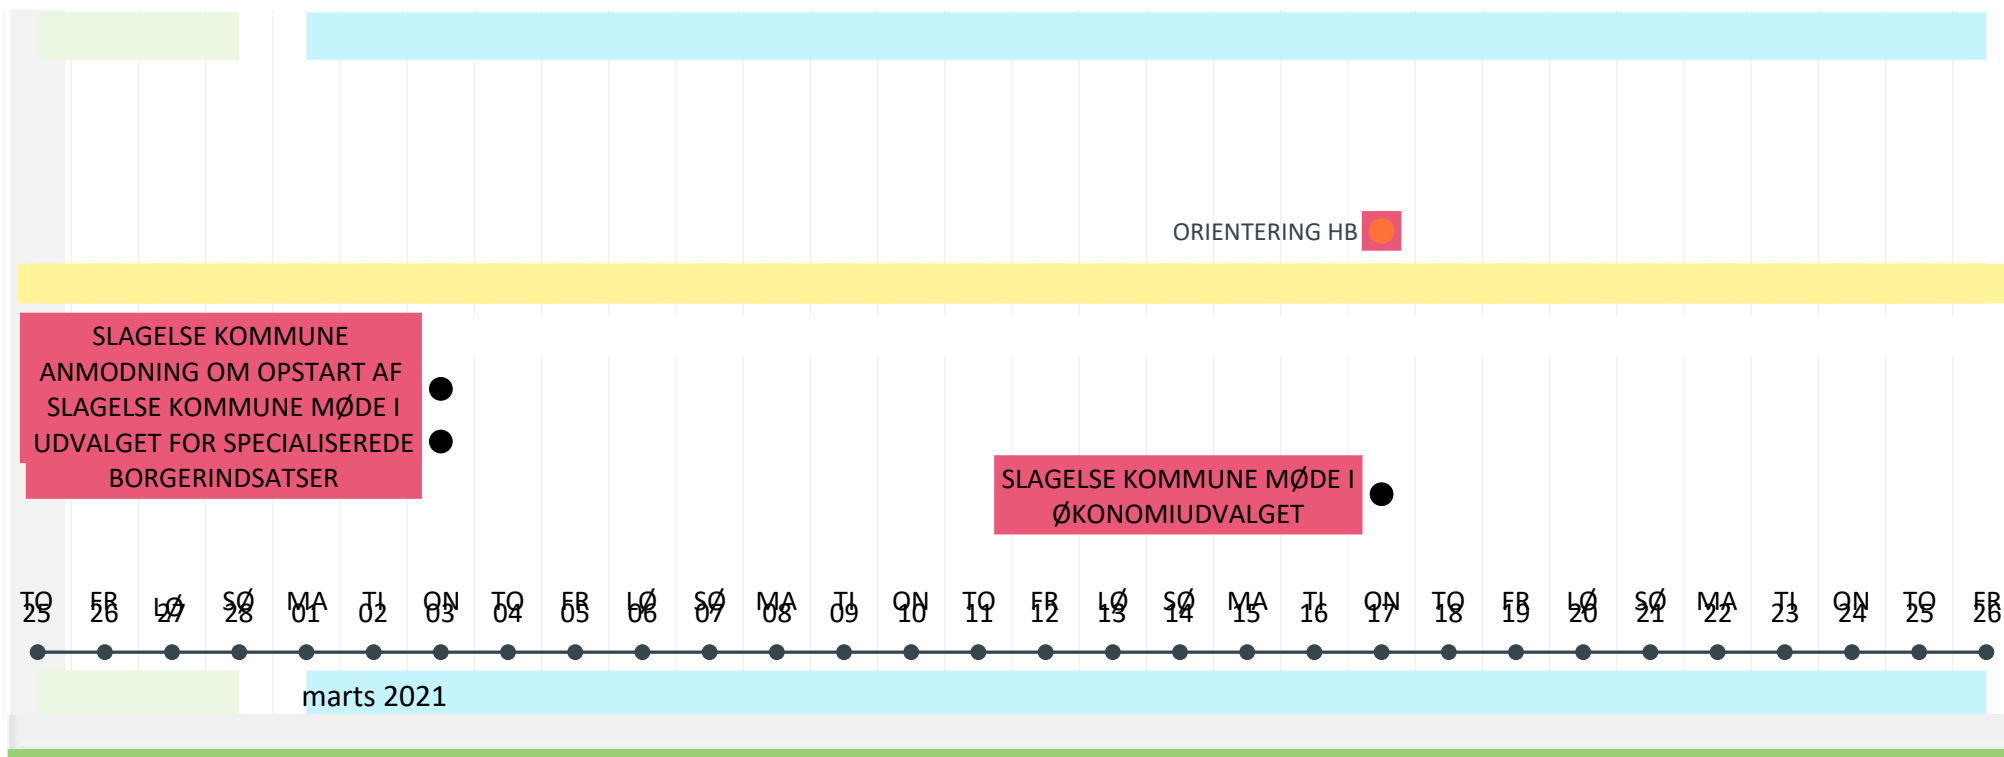

ANGIV STARTDATO:

25-02-2021

AKTIVITET	START	SLUT	NOTER
Projektstart	09-02-2021	09-02-2021	Møde Slagelse kommune
Forelæggelse FU	22-02-2021	22-02-2021	Forelæggelse og godkendelse af FU (FU indstiller til HB at vi indgår i et samarbejde med Slagelse kommune og Toften om opførelse af skæve boliger)
Orientering HB	17-03-2021	17-03-2021	Orientering af KFUM's Sociale Arbejde's hovedbestyrelse
Undersøge konstruktionsform mm	24-02-2021	25-04-2021	Det skal undersøges vedr. almennyttige boligforeninger, indhold vedtægter, finansiering af byggeri, møde med Toften vedr. boligerne,

AKTIVITET	START	SLUT	NOTER
Undersøge muligheder for Fondsstøtte til socialt byggeri	01-03-2021	30-04-2021	Undersøge mulighederne for støtte til skæve boliger ved fonde
Slagelse kommune Anmodning om opstart af lokalplan for Holbækvej 16, Slagelse	03-03-2021	03-03-2021	Slagelse kommunes Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalg skal behandle og godkende opstart af lokalplan
Slagelse kommune møde i udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	03-03-2021	03-03-2021	Udvalget skal indstille til Økonomiudvalget
Slagelse kommune møde i Økonomiudvalget	15-03-2021	17-03-2021	Økonomiudvalget skal godkende indstillingen fra Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser
Besøge skæve boliger omkring i landet	16-03-2021	15-04-2021	Omkring i landet for at se på skæveboliger
Styregruppemøde	20-04-2021	20-04-2021	Møde i styregruppe vedr. stillingtagen til udformning af skæve boliger
Udarbejdelse af vedtægter for almennyttig boligforening XX	30-04-2021	12-05-2021	Udarbejdelse af vedtægter for almennyttig boligforening
Styregruppemøde	05-05-2021	05-05-2021	
Kontakte arkitekter, byggerådgiver	24-05-2021	24-05-2021	Møde med arkitekter for udarbejdelse af skitse materiale for byggeri
Udarbejdelse af byggeprojektbeskrivelser mm	30-09-2021	30-10-2021	Udarbejdelse af byggeprojekt materiale (Arkitekt, Ingeniør) Udarbejdelse af udbudsmateriale.
Udsendelse af udbudsmateriale	14-11-2021	28-11-2021	Udbud af byggeri i totalentreprise
Åbning af tilbud på byggeriet	01-12-2021	01-12-2021	Udvælgelse af vindende entreprenør
Godkendelse af lokalplan	01-02-2022	01-02-2022	Forventet godkendelse af lokalplan

AKTIVITET	START	SLUT	NOTER
Opstart af byggeri	01-03-2022	31-08-2022	Opstart byggeri
