


Renovering af Korsør og Slagelse svømmehaller samt nyt 50-meters bassin Organisationsdiagram byggeprojekter

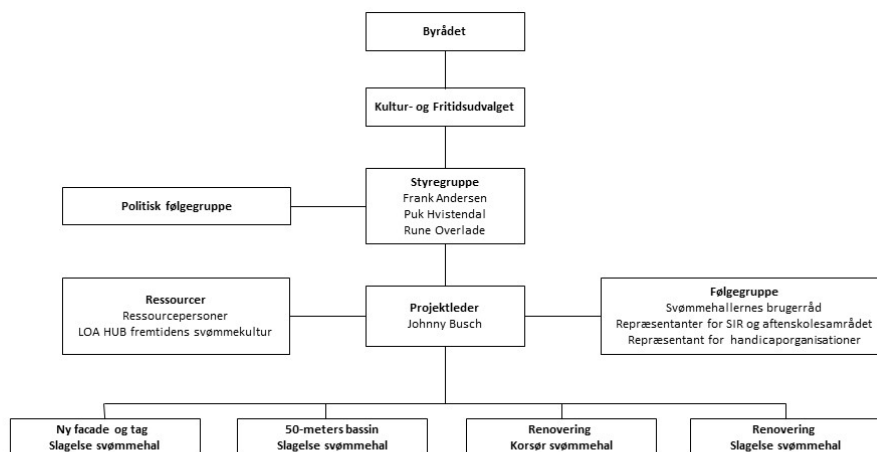

Organisering

Byggeprojekterne placeret under Kultur- og Fritidsudvalget, og de er organiseret med en styregruppe og en fælles projektleder for alle projekterne.

Den politiske følgegruppe skal sikre koblingen til borgerne via følgegruppen og dermed også sikre, at relevante input fra brugerne indarbejdes i projektet på de områder, hvor der er frie midler til wellness / udvikling af faciliteterne.

Til projektet er der knyttet en følgegruppe af brugerne bredt sammensat af relevante interessenter – herunder blandt andre Handicaprådet, samt en resursegruppe med interne og eksterne eksperter, der har særlig viden om svømmehalsbyggerier.

Beslutningen på Byrådsmødet 25. maj 2020 var en fordeling af den samlede økonomisk ramme for udbygning og renovering af svømmehaller på de tre byggeprojekter, som på grund af Corona-tiltag er ændret til fire byggeprojekter.

De fire byggeprojekter er forskellige af karakter og fordelt over en femårsperiode, og de håndteres derfor som selvstændige projekter. Projektperioderne er koordineret, så flest mulige bassiner kontant er i drift.

I tillæg til ovenstående organisationsplan er der interne arbejdsgrupper i forvaltningen for de enkelte byggeprojekter.

Renovering af Korsør og Slagelse svømmehaller samt nyt 50-meters bassin Økonomien i byggeprojekterne



Økonomi

På Byrådsmødet 25 maj 2020 blev det vedtaget en fordeling af den samlede bevilling på de enkelte bygninger og formål. Størstedelen af midlerne er afsat til "låste" formål så som betonrenovering, filteranlæg og selve nybygningen med 50-meters bassinet (røde felter).

Derudover er der afsat midler til wellness i begge svømmehaller og udvidelse af Slagelse svømmehal (grønne felter).

Udvikling og prioritering og af wellness-aktiviteter og udvidelse af Slagelse svømmehal skal udvikles og afklares i tæt samarbejde med Følgegruppen.

Forslag til indhold i wellness-aktiviteter og udvidelse af Slagelse svømmehal skal efterfølgende politiske godkendes.

Renovering af Korsør og Slagelse svømmehaller samt nyt 50-meters bassin Fremdrift

Ny facade og tag Slagelse svømmehal

- Byggestart juni 2020
- Ibrugtagning januar 2021

50-meters bassin Slagelse svømmehal

- Rådgiver februar 2021
- Projektforslag juli 2021
- Projektudvikling oktober 2021
- Byggestart december 2021
- Ibrugtagning august 2023

Renovering Korsør svømmehal

- Byggestart september 2023
- Ibrugtagning juli 2024

Renovering Slagelse svømmehal

- Byggestart august 2024
- Ibrugtagning februar 2025

Fremdrift

Byggeprojekterne er fordelt over en periode på 5 år med opstart juni i år.

Baggrunden for dette er et ønske fra brugerne om, at der i videst mulig udstrækning altid er to faciliteter åbne.

Med vedtag af organisering og principper for udbud forventes de opsatte milepæle.
