Projkettidsplan- rev A

Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet.

5 | Varighed for plan | Faktisk startdato | % fuldført | Faktisk (ud over plan) | % fuldført (ud over plan)

AKTIVITET	STARTDATO FOR PLAN	VARIGHED FOR PLAN
Planlægning af rådgiver udbud m.m.	1	9
Styregruppe møde nr. 1	5	1
Rådgvining i udbud	6	4
Spørgsmål / Svar fra rådgiver	8	1
Licitation, rådgivning	9	1
Styregruppe møde nr. 2	10	1
Rådgivning opstarter	11	2
JUL, ferie	13	1
Rådgiver projekterer	14	21
Myndighedsbehandling	22	12
Udbud til entreprenør	35	4
Kontrahering m. entreprenør	39	2
Entreprenøren mobiliserer	41	2
Ombygning t udskolingen der er på Tårnborg	43	17
Ombygning t. resterende udskoling	60	11
Ombygning t. mellemtrinnet	70	16
Ombygning t. indskoling og sårbare elever	70	16
Ombygning af tjeneste boliger	94	6
Intern flytning udskoling Tårnborg (25 pax)	60	1
Flytte resterende udskoling t. Tårnborg (35 pax)	71	1
Flytte mellemtrin t. Tårnborg (30 pax)	96	1
Flytte indskoling og Sårbare elever t. Tårnborg (25 + 24 pax)	96	1
Aktivitet 22		
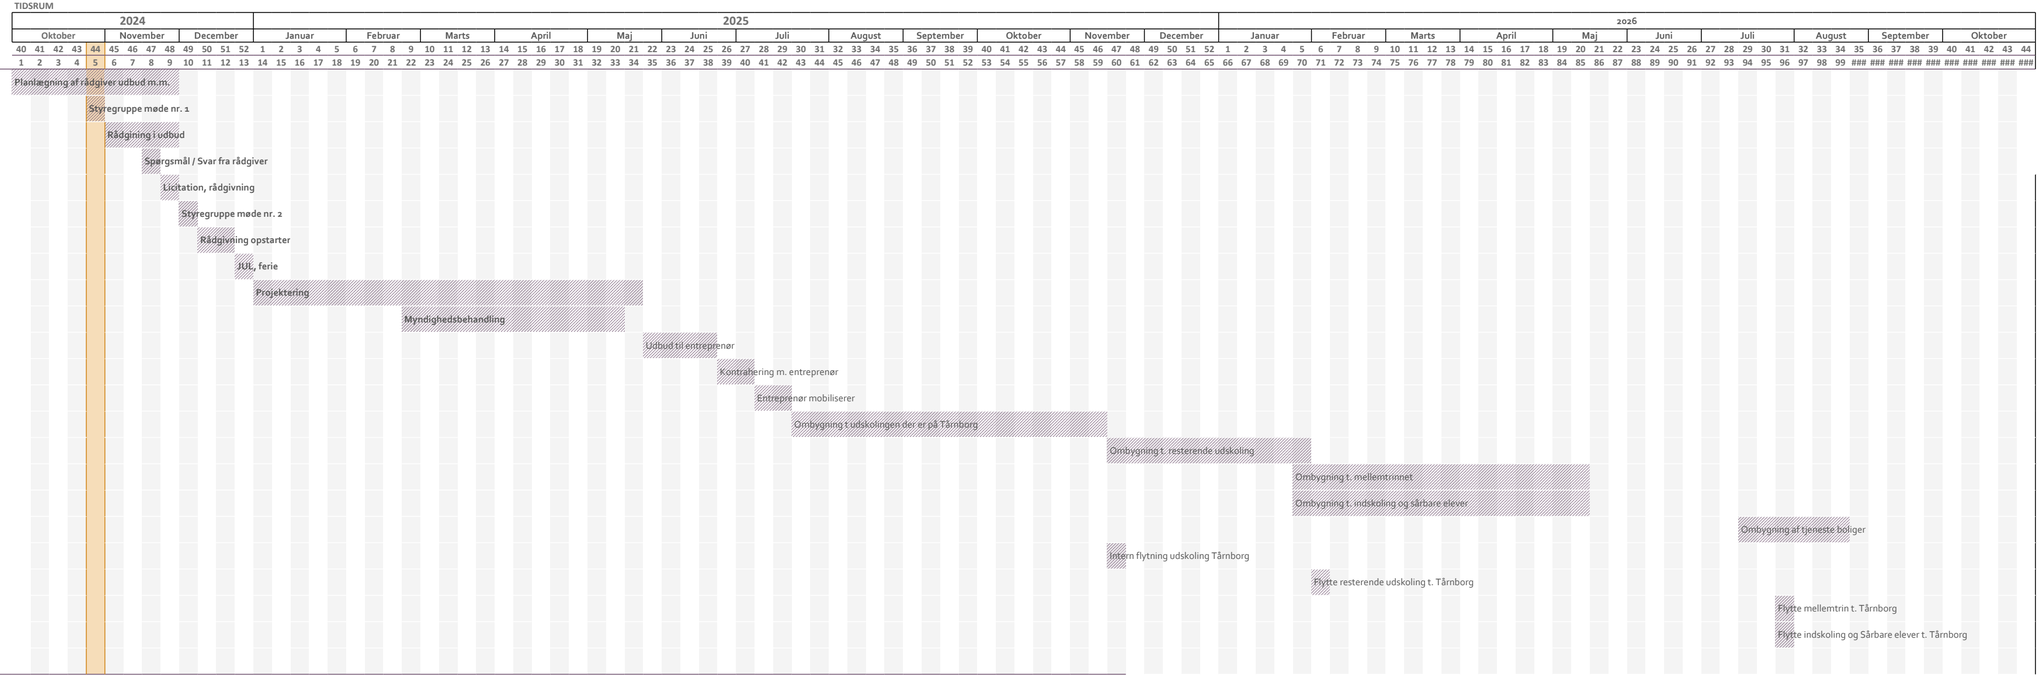
TIDSRUM
