Projekttidspaln Tidselbjerget 30.03.16.
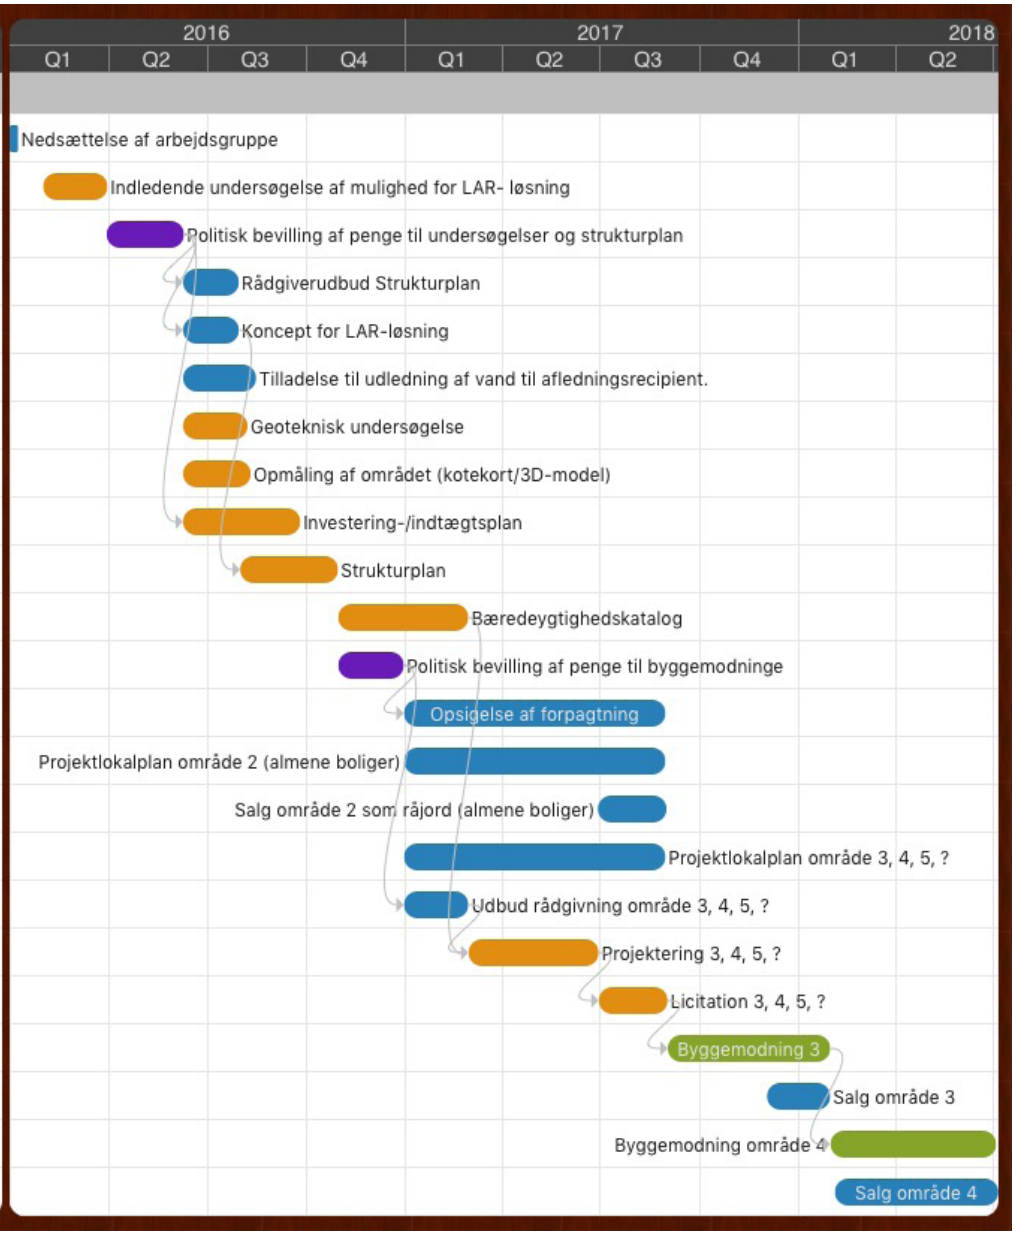
Opgave	Start	Slut	Resurse
	1. jan. 2016	6. jul. 2018	
Nedsættelse af arbejdsgruppe	1. jan. 2016	8. jan. 2016	Plan
Indledende undersøgelse af mulighed for LAR- løsning	1. feb. 2016	31. mar. 2016	Plan
Politisk bevilling af penge til undersøgelser og strukturplan	31. mar. 2016	10. jun. 2016	Styregruppen
Rådgiverudbud Strukturplan	10. jun. 2016	31. jul. 2016	Bygherrerådgivning
Koncept for LAR-løsning	10. jun. 2016	31. jul. 2016	Styregruppen
Tilladelse til udledning af vand til afledningsrecipient.	10. jun. 2016	16. aug. 2016	Bygherrerådgivning
Geoteknisk undersøgelse	10. jun. 2016	8. aug. 2016	Ekstern rådgiver
Opmåling af området (kotekort/3D-model)	10. jun. 2016	11. aug. 2016	Ekstern rådgiver
Investering-/indtægtsplan	10. jun. 2016	26. sep. 2016	Ekstern rådgiver
Strukturplan	2. aug. 2016	31. okt. 2016	Ekstern rådgiver
Bæredeygtighedskatalog	1. nov. 2016	1. mar. 2017	Ekstern rådgiver
Politisk bevilling af penge til byggemodninge	1. nov. 2016	31. dec. 2016	Styregruppen
Opsigelse af forpagtning	1. jan. 2017	31. aug. 2017	Køb og Salg
Projektlokalplan område 2 (almene boliger)	1. jan. 2017	31. aug. 2017	Plan
Salg område 2 som råjord (almene boliger)	30. jun. 2017	1. sep. 2017	Køb og Salg
Projektlokalplan område 3, 4, 5, ?	1. jan. 2017	31. aug. 2017	Plan
Udbud rådgivning område 3, 4, 5, ?	1. jan. 2017	1. mar. 2017	Bygherrerådgivning
Projektering 3, 4, 5, ?	2. mar. 2017	30. jun. 2017	Ekstern rådgiver
Licitation 3, 4, 5, ?	1. jul. 2017	2. sep. 2017	Ekstern rådgiver
Byggemodning 3	3. sep. 2017	31. jan. 2018	Entreprenør
Salg område 3	4. dec. 2017	31. jan. 2018	Køb og Salg
Byggemodning område 4	1. feb. 2018	4. jul. 2018	Ekstern rådgiver
Salg område 4	5. feb. 2018	6. jul. 2018	Køb og Salg
