

Procesplan for revision af indsatsplan

Fase 1 – Opstart & organisering

Formål: Sætte projektet op og skabe organisatorisk forankring

Aktiviteter

- ☐ Etablering af projektgruppe, intern følgegruppe og ledelsesmæssig organisering
- ☐ Udarbejdelse af procesplan
- ☐ Orientering af SK Vand om opstart
- ☐ **Klima- og Miljøudvalget:** Præsentation af grundvandsområdet 23/3 2026
- ☐ **Klima- og Miljøudvalget:** Forelæggelse og behandling af procesplan 4/5 2026

Milepæl: Procesplan politisk godkendt

Estimat: 3 måneder

Rød = Politisk involvering

Blå = Inddragelse af interessenter

Fase 2 – Dataindsamling & grundlag

Formål: Skabe det faglige fundament for indsatsplanen

Aktiviteter

- ☐ Indsamling af data: Resumé af grundvandskortlægning og nyere viden.
- ☐ Indhentning af supplerende data og analyser
- ☐ Udarbejdelse af detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse for relevante forureningskilder
- ☐ Vurdering af konsekvenser for vandforsyningsstrukturen ved forurening
- ☐ Dialogmøder med SK Vand A/S - Dataudveksling og drøftelse
- ☐ Afgrænsning af "Områder hvor størstedelen af drikkevandet dannes"
- ☐ Generel vurdering af omkostninger ved indsatser
- ☐ Drøftelse og koordinering i intern følgegruppe

Milepæl: Fagligt grundlag klar

Estimat: 3 måneder

Procesplan for revision af indsatsplan

Fase 3 – Dialog & interessentinddragelse

Formål: Sikre åbenhed og inddragelse af berørte parter

Aktiviteter

- ☐ Dialogmøder med SK Vand A/S – drøftelse af indsatser
- ☐ Indledende møde i Grundvandsrådet – orientering og drøftelse
- ☐ Borgermøde (vandforbrugerne) – orientering og drøftelse
- ☐ Inddragelse af relevante lokalråd
- ☐ Lodsejermøde – orientering og drøftelse
- ☐ Fælles vandværksmøde – orientering
- ☐ Temamøde: **Klima- og Miljøudvalget** og SK Vand
- ☐ Løbende inddragelse af intern følgegruppe

Milepæl: Interessent-input integreret i arbejdet

Estimat: 6 måneder (heraf sommerferie)

Fase 4 – Udarbejdelse af planforslag (inkl. inddragelse)

Formål: Skabe første udkast til plantillæg

Aktiviteter

- ☐ Udarbejdelse af udkast til plantillæg
- ☐ Drøftelse af forslag i intern følgegruppe
- ☐ Dialogmøder med SK Vand A/S – drøftelse af planforslag
- ☐ Møde i Grundvandsrådet – præsentation og drøftelse af udkast til plantillæg
- ☐ Borgermøde (vandforbrugerne) – præsentation og drøftelse af udkast til plantillæg
- ☐ Inddragelse af relevante lokalråd
- ☐ Lodsejermøder, områdevis – præsentation og drøftelse af udkast til plantillæg
- ☐ Individuelle møder med særligt berørte lodsejere
- ☐ Fælles vandværksmøde – orientering
- ☐ Forberedelse af politisk sag

Milepæl: Forslag til plantillæg klar til politisk behandling

Estimat: 7 måneder

Procesplan for revision af indsatsplan

Fase 5 – Politisk behandling før høring

Formål: Få forslagene til plantillæg godkendt til offentlig høring

Aktiviteter

- ☐ **Klima- og Miljøudvalget:** Behandling og indstilling til Byrådet
- ☐ **Byrådet:** Godkendelse af igangsætning af høring

Milepæl: Offentlig høring kan igangsættes

Estimat: 2½ måned

Fase 6 – Offentlig høring

Formål: Indsamle bemærkninger og sikre gennemsigtighed

Aktiviteter

- ☐ Offentlig høring af forslag til plantillæg - Høringsperiode (12 uger)
- ☐ Underretning af berørte lodsejere om høring
- ☐ Håndtering af høringssvar og udarbejdelse af hvidbog

Milepæl: Høring gennemført og hvidbog udarbejdet

Estimat: 4 måneder

Fase 7 – Endelig politisk vedtagelse

Formål: Vedtage de endelige plantillæg


Aktiviteter

- ☐ Udarbejdelse af endelige forslag til plantillæg
- ☐ Møde i Grundvandsrådet – præsentation af de endelige forslag
- ☐ **Klima- og Miljøudvalget:** Behandling og indstilling til Byrådet
- ☐ **Byrådet:** Endelig vedtagelse
- ☐ Offentliggørelse af endelige plantillæg
- ☐ Underretning af berørte lodsejere

Milepæl: Indsatsplan vedtaget

Estimat: 2½ måneder

Procesplan for revision af indsatsplan

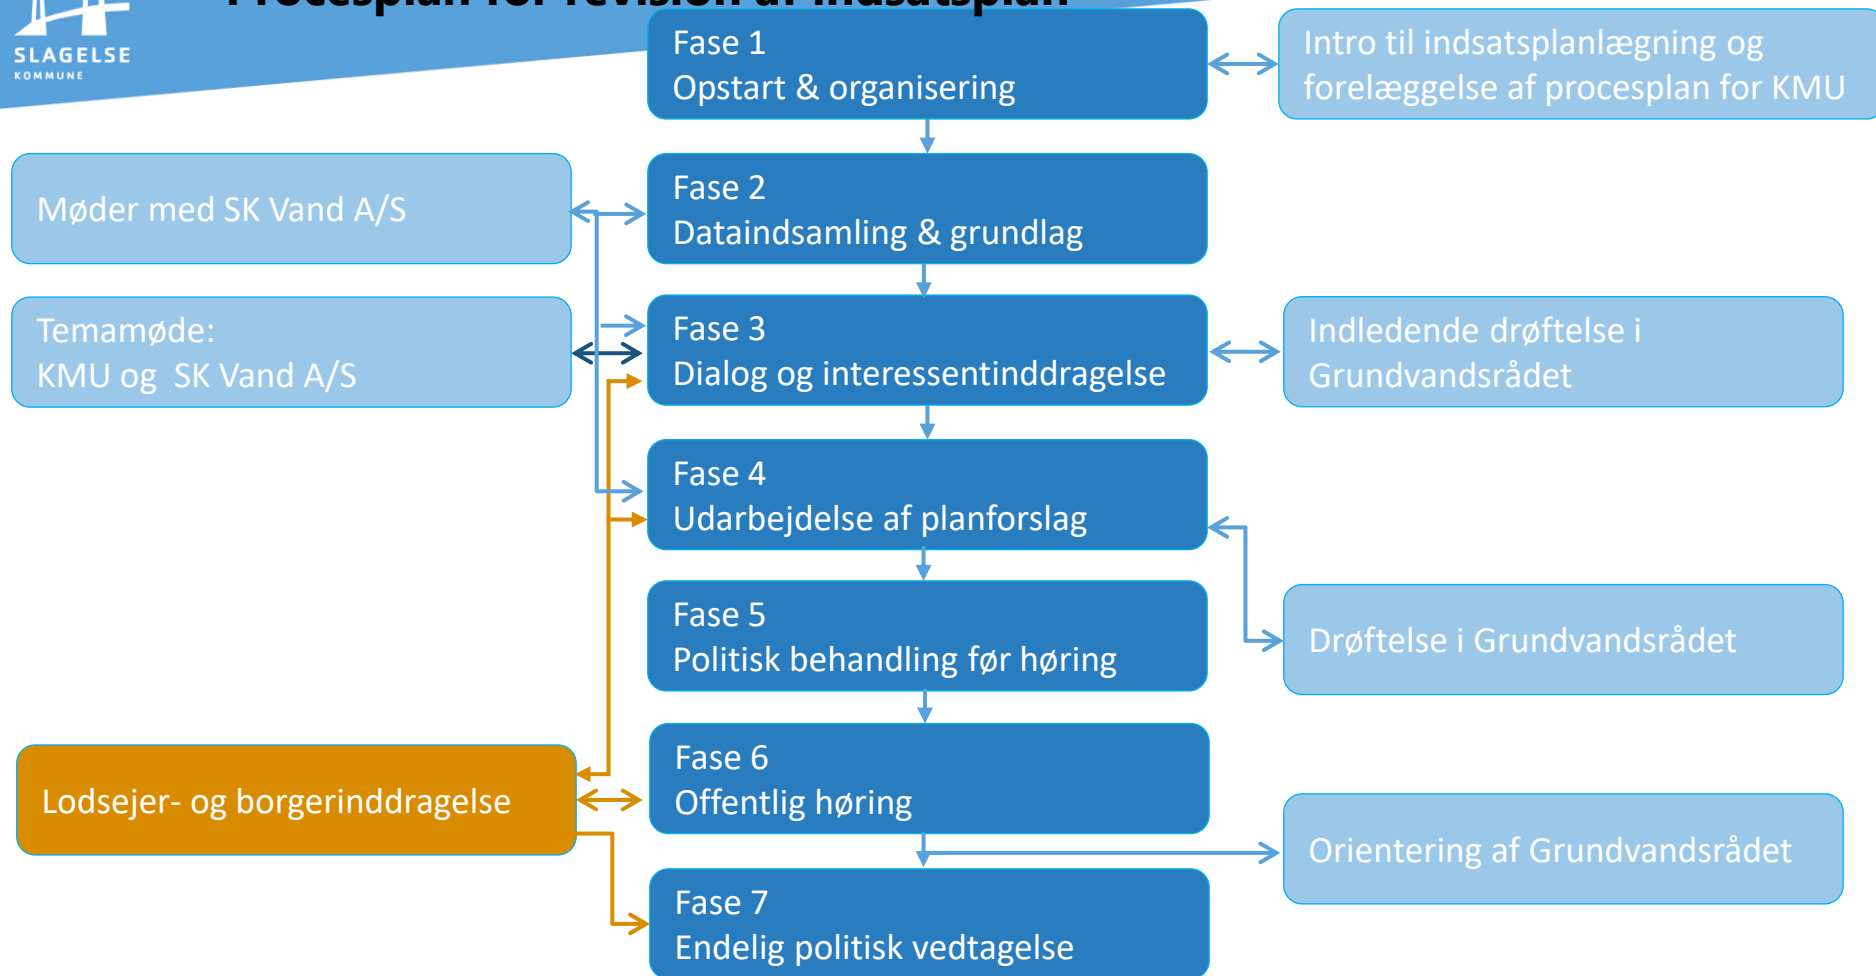

Procesplan for revision af indsatsplan

2026

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

|

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

2027

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Fase 1

Opstart & organisering

Fase 2

Dataindsamling &
grundlag

Fase 3

Dialog og interessentinddragelse

Fase 4

Udarbejdelse af planforslag (inkl. inddragelse)

Fase 5

Politisk behandling
før høring

Fase 6

Offentlig høring

Fase 7

Politisk vedtagelse
